

WROTA STATYSTYKI od kuchni

Agnieszka Nowakowska

Lider Biura Projektu


Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów
Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

30.11.2023 r. Warszawa

Okres realizacji projektu i jego wartość

Okres realizacji projektu:

od 01.12.2019 r. do 30.11.2022 r./28.02.2023 r./**31.12.2023 r.**




Wartość całkowita projektu - **28 651 402,44 zł** brutto.


Kwota kwalifikowalna – **28 651 402,44 zł** (podatek VAT jest w całości kwalifikowalny) i w całości podlega dofinansowaniu, z czego:

- **84,63%** w kwocie **24 247 681,88 zł** stanowią środki UE (EFRR),
- **15,37%** w kwocie **4 403 720,56 zł** stanowi współfinansowanie krajowe ze środków budżetowych z części 58 Główny Urząd Statystyczny.

Struktura organizacyjna projektu

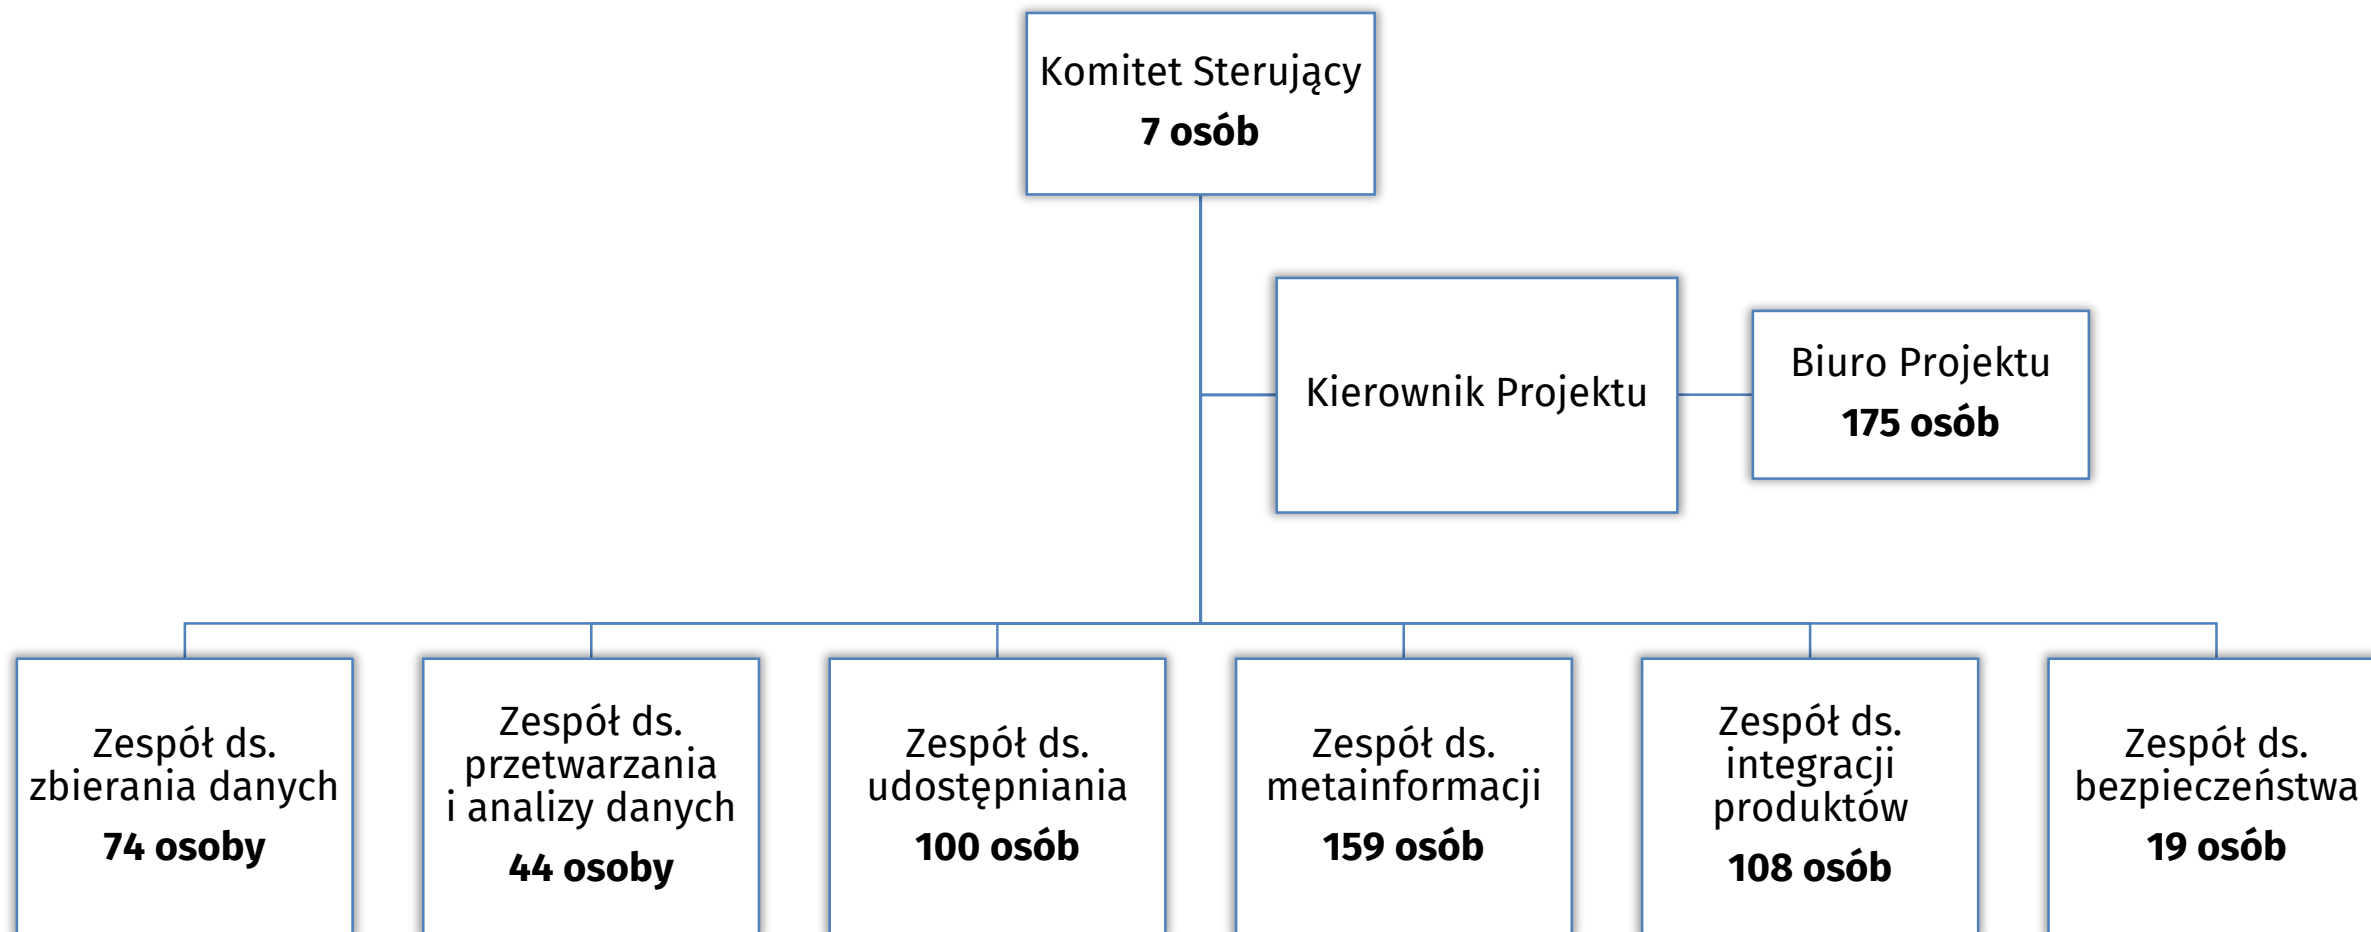

Struktura organizacyjna Biura Projektu

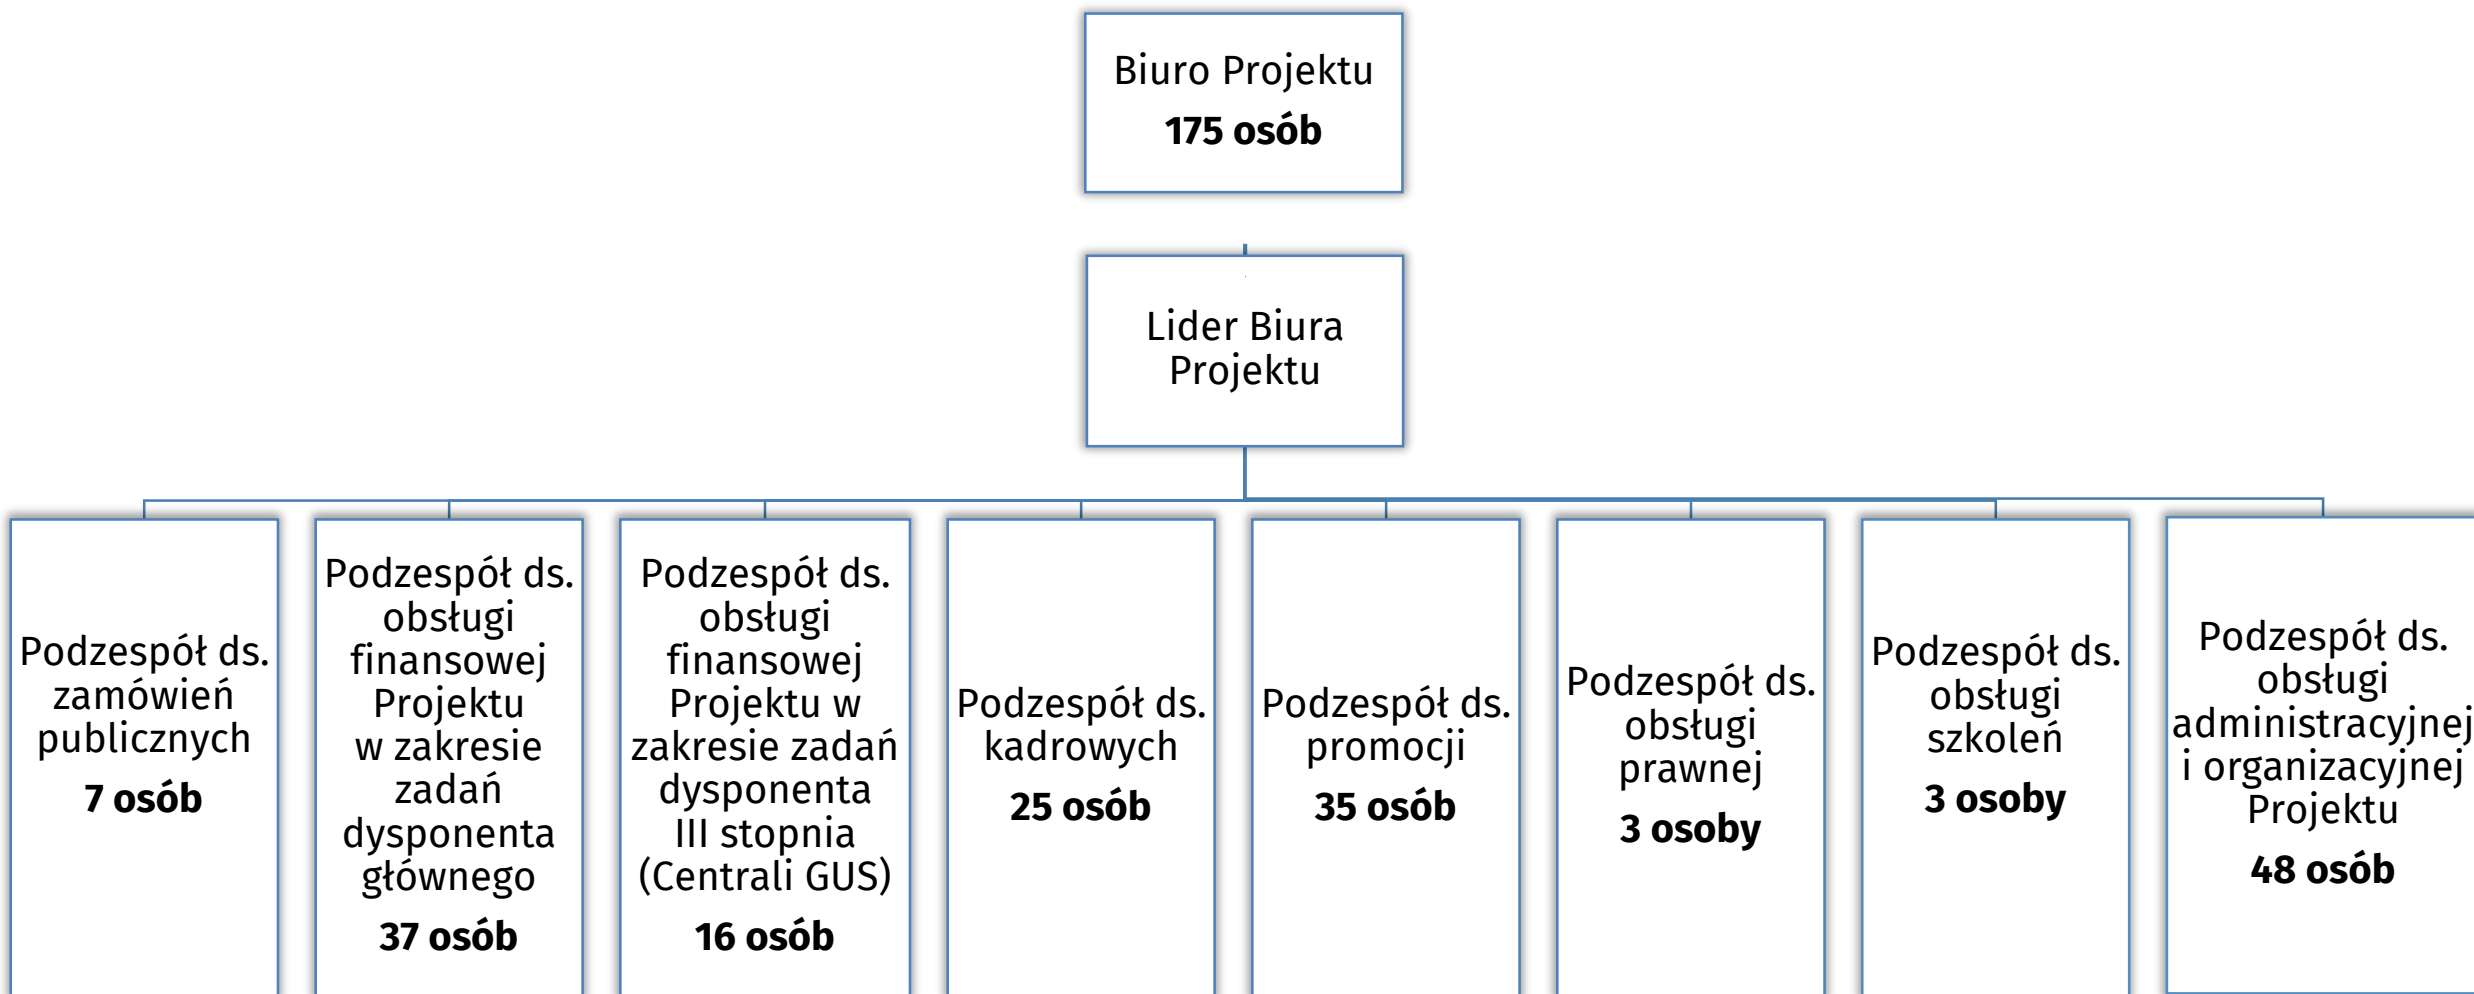

Zadania Biura Projektu

- Weryfikacja i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
- Rozliczanie finansowe projektu.
- Obsługa księgowo, kadrowa i prawna.
- Planowanie i realizacja promocji projektu.
- Przygotowanie i realizacja szkoleń.
- Obsługa administracyjna i organizacyjna projektu.

Porozumienie i aneksy

27.01.2020 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Głównym Urzędem Statystycznym.

Aneks nr	Data podpisania aneksu	Zmiany wprowadzone aneksem
1	30.11.2020	Przedłużenie terminu realizacji projektu do 28.02.2023 r.
2	05.05.2021	Zmiana w zakresie realizacji systemu akceleracji ruchu w sieci WAN.
3	23.06.2021	Zainicjowane przez CPPC, dotyczące rozliczania projektu.
4	27.12.2021	
5	27.02.2023	Przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r.
6	10.08.2023	Zmiana sposobu realizacji Portalu Informacyjnego 2.0., zmniejszenie wartości projektu oraz zwiększenie limitu kosztów pośrednich w projekcie.
7	12.2023	Zmniejszenie wartości projektu.

Plan naprawczy - aneks nr 5

Plan naprawczy został opracowany z uwagi **na opóźnienia w realizacji Portalu Informacyjnego (PI) 2.0.** - niedotrzymanie terminów realizacji przez Wykonawcę pomimo podpisania 2 aneksów wydłużających termin realizacji umowy.

Konieczne było odstąpienie od umowy i zmiana sposobu realizacji zadania. Plan naprawczy zakładał wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r. oraz przesunięcie działań promocyjnych.

Na realizację planu składały się następujące zadania:

- opracowanie i wdrożenie systemu CMS,
- wdrożenie PI 2.0.,
- przeprowadzenie szkoleń z PI 2.0.,
- przeprowadzenie działań promocyjnych.



Jednostki, z którymi współpracowało Biuro Projektu



Centrum Projektów Polska Cyfrowa



Centralny Ośrodek Informatyki



Kancelaria Prezesa Rady Ministrów



Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej



Ministerstwo Finansów



Podstawowe fakty o projekcie

Wydatki

ponad 28 mln zł

Wykonawcy

12 podmiotów wyłonionych w ramach postępowań przetargowych

Eksperti JSSP

274 pracowników GUS
154 pracowników CIS
158 pracowników US


Liczba godzin wsparcia zewnętrznego

ponad 7 tys. godzin wsparcia w pracach zarządczych
ponad 36 tys. godzin wsparcia informatycznego


Podstawowe fakty o projekcie – szkolenia zewnętrzne



Podstawowe fakty o projekcie – szkolenia wewnętrzne

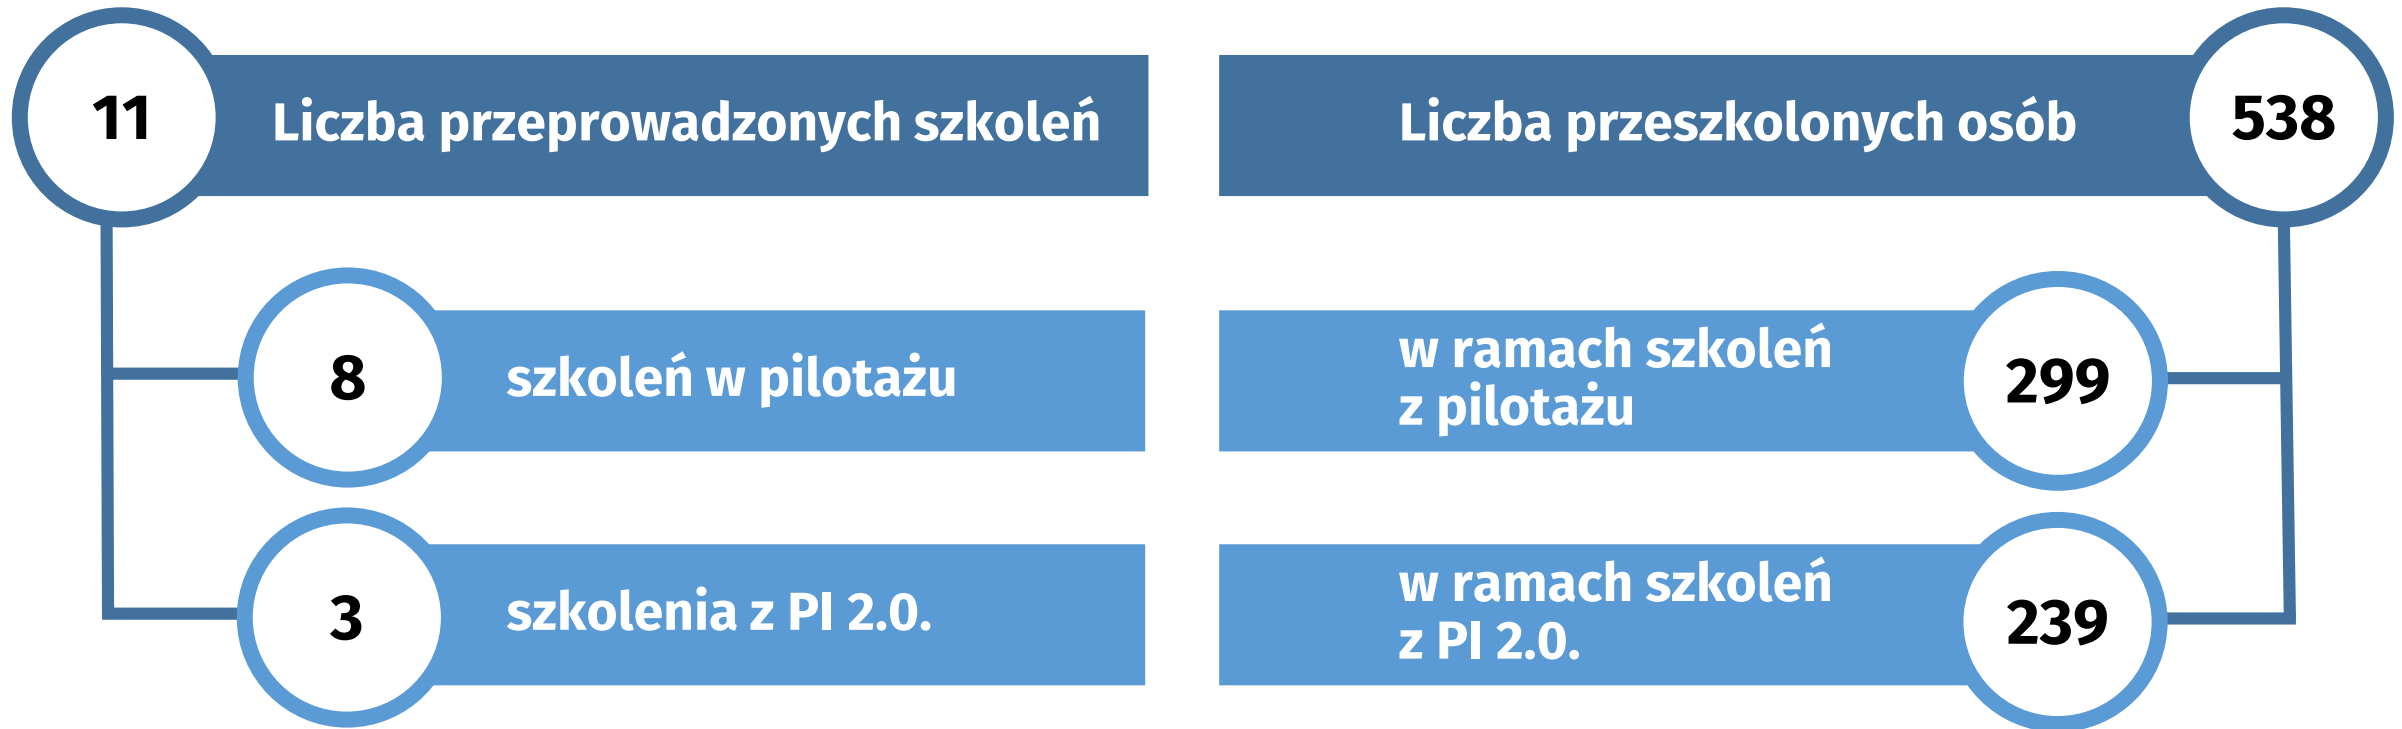

Podstawowe fakty o projekcie - wydatki

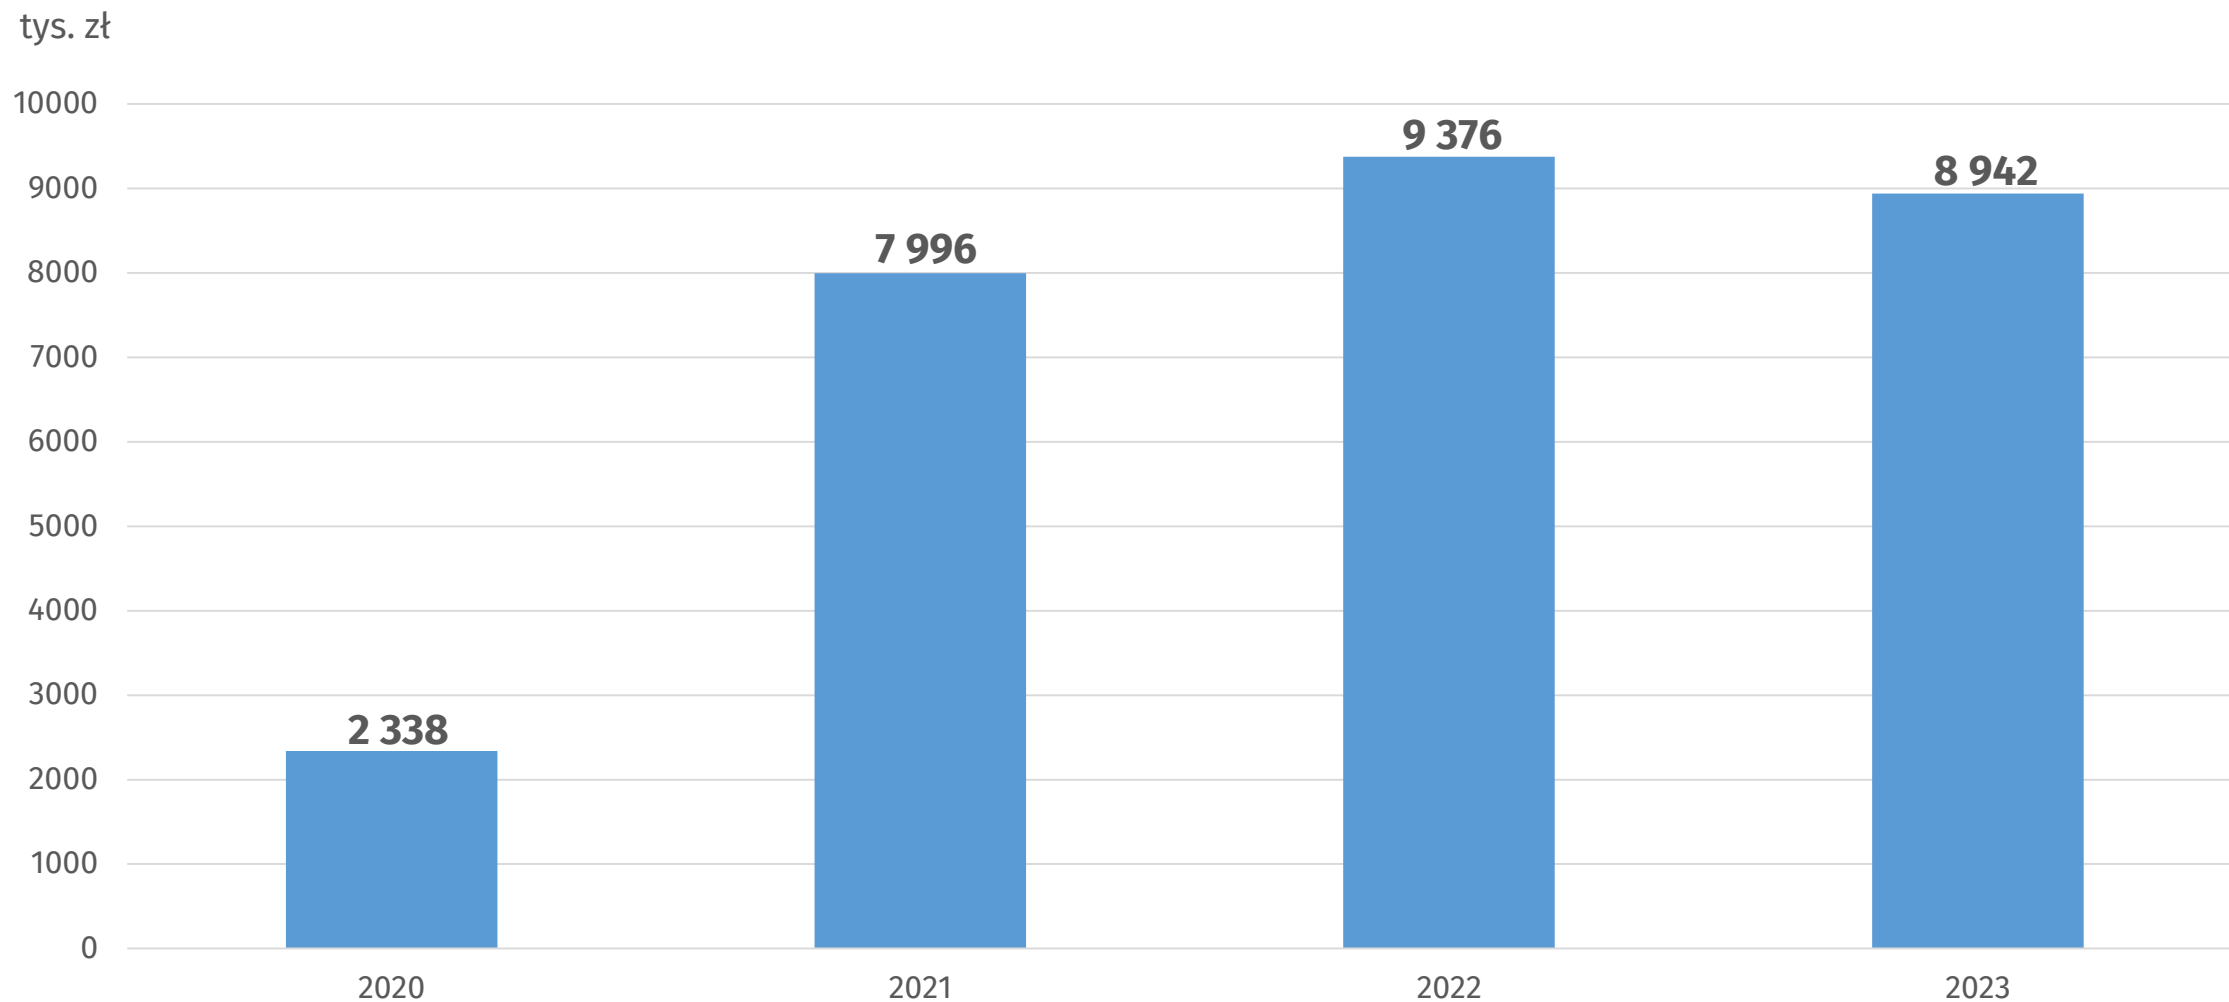

Podstawowe fakty o projekcie

12	przeprowadzonych postępowań
14	wniosków o uruchomienie rezerwy celowej
17	posiedzeń Komitetu Sterującego
17	raportów z postępu rzeczowo-finansowego
21	wniosków o płatność
35	wniosków o zmianę w planie wydatków budżetowych

Podstawowe fakty o projekcie - przeprowadzone postępowania



1. Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej związanych z realizacją projektu WROTA STATYSTYKI.
2. Świadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej, w ramach zadania Usługi wsparcia ds. IT.
3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jssp podległych Prezesowi GUS.
4. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania CMS opartego na open source Drupal.

Podstawowe fakty o projekcie - przeprowadzone postępowania – cd.



5. Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji Projektu WROTA STATYSTYKI.
6. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu WROTA STATYSTYKI oraz produktów wytworzonych w ramach projektu.
7. Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt WROTA STATYSTYKI.



Podstawowe fakty o projekcie - przeprowadzone postępowania – cd.



8. Rozbudowa Platformy udostępniania wyników informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych.
9. Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych.
10. Modernizacja systemu Serwis Desk.
11. Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji.
12. Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN.



Korzyści dla organizacji wynikające z realizacji projektu.

1. Usprawnienie procesów produkcji statystycznej.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych zespołu.
3. Podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem dużym interdyscyplinarnym zespołem.
4. Wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z wieloma zespołami złożonymi z pracowników różnych jssp.
5. Zbudowane relacje pomiędzy biznesem a informatykami.
6. Przejście od tradycyjnych metod zarządzania (PRINCE2) do metodyk zwinnych (AGILE).

Więcej informacji: stat.gov.pl/wrota-statystyki

Dziękuję za uwagę

Agnieszka Nowakowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

Główny Urząd Statystyczny

a.nowakowska@stat.gov.pl
